

BẢN TRÌNH BÀY LÃNH ĐẠO

Kế hoạch Công nghệ trọng tâm 2026

Chuyển định hướng công nghệ thành danh mục triển khai có mốc, có KPI, có sản phẩm bàn giao và có căn cứ lập kế hoạch 2027.

06–12

Thời gian triển khai trong năm 2026

6

Lĩnh vực trọng tâm công nghệ

27+

Hạng mục có thể giao việc và nghiệm thu

MỤC TIÊU ĐIỀU HÀNH

Không chỉ lập kế hoạch — cần tạo hệ thống triển khai đo được

01

Chọn đúng việc

Xác định hạng mục ưu tiên, phạm vi thí điểm và tiêu chí dừng/nhân rộng.

02

Quản trị bằng dữ liệu

Chuẩn hóa nhiệm vụ, dashboard, cảnh báo và data catalog cho điều hành.

03

Nghiệm thu rõ ràng

Mỗi hạng mục có sản phẩm bàn giao, KPI, owner và mốc tháng 11/2026.

6 NHÓM CHƯƠNG TRÌNH

Khung triển khai công nghệ của TCT TDT năm 2026

Nền tảng số

- Quản trị công việc
- Văn bản/phê duyệt điện tử
- Kho dữ liệu dùng chung

AI & điều hành

- Trợ lý AI nội bộ
- Dashboard lãnh đạo
- Cảnh báo rủi ro

Công nghệ công nghiệp

- Số hóa sản xuất
- Giám sát thiết bị
- QC, kho, năng lượng

Vật liệu chiến lược

- Danh mục vật liệu
- Thử nghiệm cải tiến
- Hợp tác viện/trường

Đô thị & BĐS

- Quản lý dự án BĐS
- Tài sản/vận hành đô thị
- CRM & cổng cư dân

Sản phẩm hóa & IP

- Quy trình sản phẩm hóa
- MVP nội bộ
- Bảo hộ & thương mại hóa

Từ hồ sơ rời rạc đến quyết định điều hành dựa trên dữ liệu

Dữ liệu & hồ sơ

Kế hoạch, tiến độ, quy trình, báo cáo, hồ sơ dự án, dữ liệu vận hành.



Nền tảng lõi

NotebookLM/kho tri thức, data catalog, dashboard, mẫu báo cáo và cảnh báo.



Thí điểm & nghiệm thu

Chạy với dữ liệu thật, đo KPI, nghiệm thu tháng 11 và lập kế hoạch 2027.

Điểm kiểm soát


- Owner rõ ràng cho từng hạng mục
- KPI đo được theo tuần/tháng
- Cảnh báo sớm việc chậm/rủi ro

Sản phẩm bàn giao

- Dashboard, quy trình, biểu mẫu
- Kho tri thức và báo cáo tổng hợp
- Biên bản nghiệm thu và đề xuất 2027

06-12/2026

Tiến độ triển khai theo 5 chặng quản trị

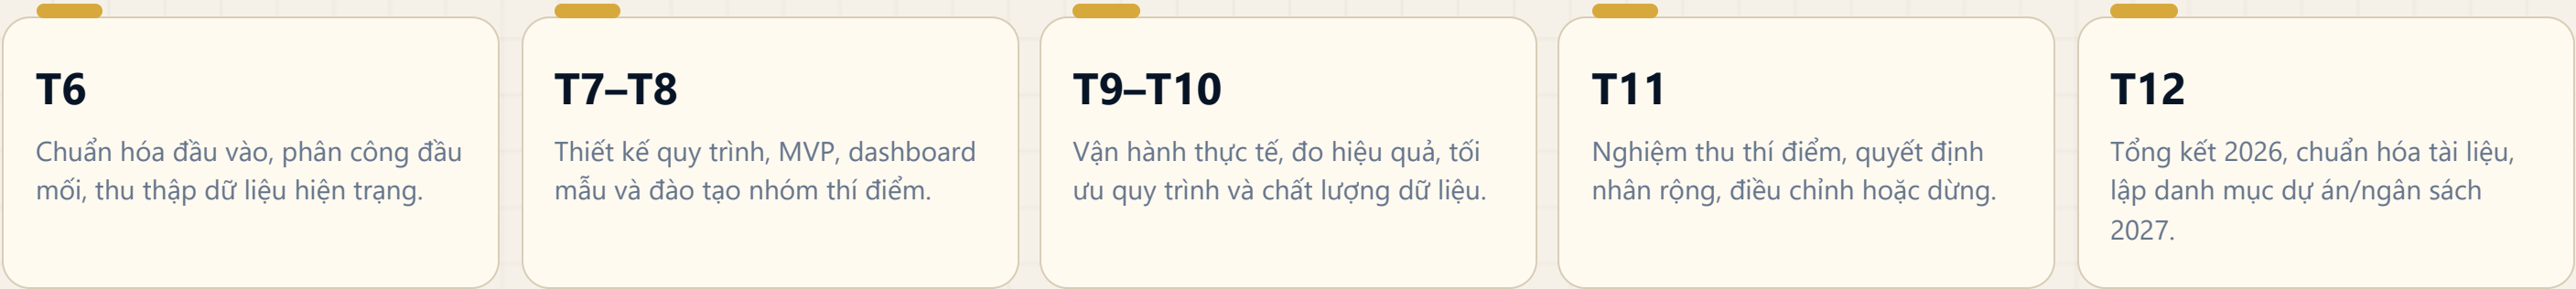

5 HẠNG MỤC KHỞI ĐỘNG TRƯỚC

Ưu tiên các nền tảng tạo dữ liệu và năng lực điều hành

Hạng mục	T6	T7-T8	T9-T10	T11	KPI chính
Quản trị công việc & tiến độ	•	•	•	▲	≥80% việc cập nhật đúng hạn
Kho dữ liệu dùng chung	•	•	•	▲	5 nhóm dữ liệu chuẩn hóa
Dashboard điều hành	🕒	•	•	▲	≥5 dashboard dữ liệu thật
Trợ lý AI nội bộ	🕒	•	•	▲	Đúng nguồn ≥80%
AI hỗ trợ văn bản/báo cáo	•	•	▲	🕒	20 prompt, 10 mẫu tài liệu

CÁC ĐIỂM NGHẼN CẦN KIỂM SOÁT

Rủi ro chính không nằm ở công nghệ, mà ở dữ liệu và thói quen vận hành

Dữ liệu thiếu chuẩn

Mỗi đơn vị lưu một kiểu, chỉ số không thống nhất.

- Gán owner dữ liệu
- Chuẩn hóa data catalog

Người dùng không cập nhật

Dashboard mất giá trị nếu tiến độ không được nhập đều.

- Gắn với hợp giao ban
- Cảnh báo quá hạn

Rủi ro bảo mật AI

Tài liệu nhạy cảm cần phân loại trước khi đưa vào AI.

- Phân quyền nguồn
- AI chỉ là bản nháp

Nguyên tắc kiểm soát

Triển khai nhỏ, có dữ liệu thật, đo được hiệu quả, có biên bản nghiệm thu.

Nguyên tắc mở rộng

Chỉ nhân rộng khi có owner, quy trình vận hành, KPI và chi phí duy trì rõ ràng.

Chốt 4 quyết định để chương trình đi vào thực thi từ tháng 06/2026

01

Phê duyệt danh mục ưu tiên

Chọn nhóm nền tảng số, dữ liệu, AI và dashboard làm hạt nhân khởi động.

02

Chỉ định owner từng hạng mục

Mỗi hạng mục có đơn vị phụ trách, phối hợp, KPI và lịch báo cáo.

03

Cho phép thí điểm dữ liệu thật

Áp dụng trong phạm vi nhỏ, có kiểm soát bảo mật và phân quyền.

04

Thiết lập họp điều hành tháng

Dùng dashboard và báo cáo cảnh báo làm căn cứ xử lý điểm nghẽn.

THÔNG ĐIỆP CHÍNH

2026 là năm xây nền tảng vận hành công nghệ có dữ liệu, có AI, có nghiệm thu

1

Làm ít nhưng chắc

Ưu tiên thí điểm có dữ liệu thật và giá trị đo được.

2

Dùng dữ liệu để điều hành

Dashboard, cảnh báo và báo cáo tự động thay thế tổng hợp thủ công.

3

Tạo nền cho 2027

Kết quả nghiệm thu là căn cứ lập ngân sách, nhân rộng và sản phẩm hóa.
